

VALORIZAR O TERRITÓRIO SETE ANOS DE POVT



VELÓDROMO NACIONAL, ANADIA | 21 ABRIL 2015



PONTO DE SITUAÇÃO DO POVT E FATORES DE SUCESSO NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA

HELENA PINHEIRO DE AZEVEDO,

GESTORA DO PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO



POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS...

- ... AO NÍVEL DO COMPROMISSO DOS FUNDOS
- ... AO NÍVEL DA EXECUÇÃO DOS FUNDOS

O QUE FALTA FAZER...

- ... EM TERMOS DE EXECUÇÃO GLOBAL ATÉ 31 DEZ 2015
- ... PARA ENCERRAR O POVT
- ... PARA O ENCERRAMENTO DE PROJETOS
 - ... RELATÓRIOS FINAIS APRESENTADOS
 - ... RELATÓRIOS FINAIS EM FALTA

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS...

... AO NÍVEL DO COMPROMISSO DOS FUNDOS

- ✓ Criar condições para a **aceleração da implementação dos projetos**
- ✓ **Monitorizar riscos de não execução e ajustar montantes aprovados** à real capacidade de execução dentro do período de elegibilidade do Programa (até 31-dez-2015)
- ✓ **Assegurar compromissos acima do programado (overbooking)** para completa absorção das dotações programadas em cada um dos Fundos comunitários, face a quebras de execução :
Fundo de Coesão / FEDER

- ✓ **Continuidade da “Operação Limpeza”**
- ✓ **Aprovação de projetos acima da dotação do Programa (overbooking)**

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS...

... AO NÍVEL DO COMPROMISSO DOS FUNDOS (ATÉ MARÇO 2015)



Fundo / Eixo Prioritário	Programado (milhões €)	Comprometido (milhões €)	Overbooking (milhões €)	Taxa de Compromisso
Fundo de Coesão	3.060	3.220	160	105%
EP1 - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável	945	1.040	95	110%
EP2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos	1.775	1.845	70	104%
EP3 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores	105	101	-4	96%
EP4 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira	235	233	-2	99%
FEDER	1.283	1.383	100	108%
EP5 - Infra-estruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano	1.234	1.339	105	108%
EP6 - Assistência Técnica	49	44	-4	91%
Programa Operacional Valorização do Território	4.343	4.603	261	106%

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES


INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENDÁRIO
ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

COM QUE BENEFICIÁRIOS...

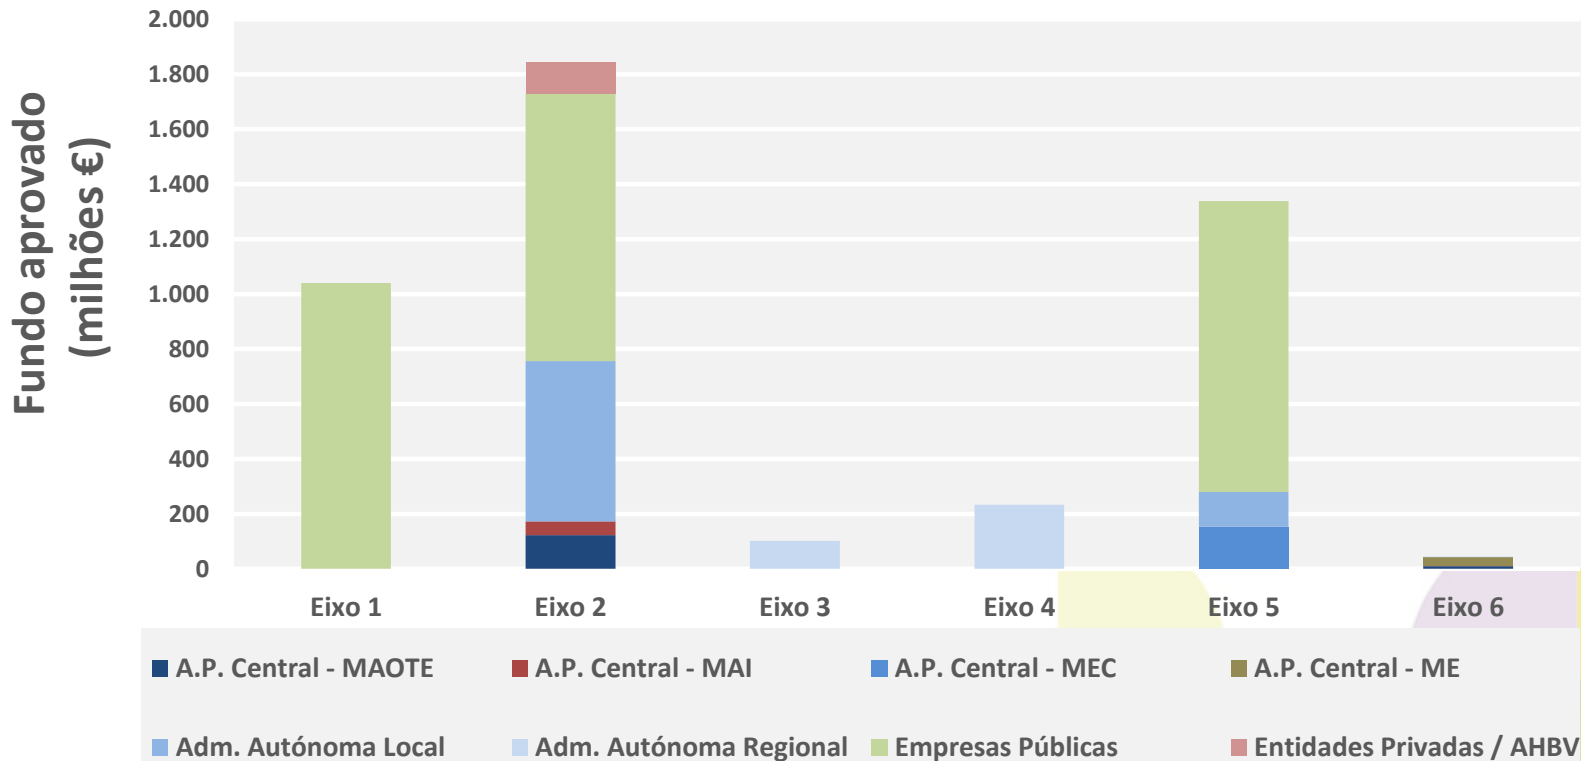

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE


OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

EM QUE REGIÕES...

Nº de projetos aprovados por Região

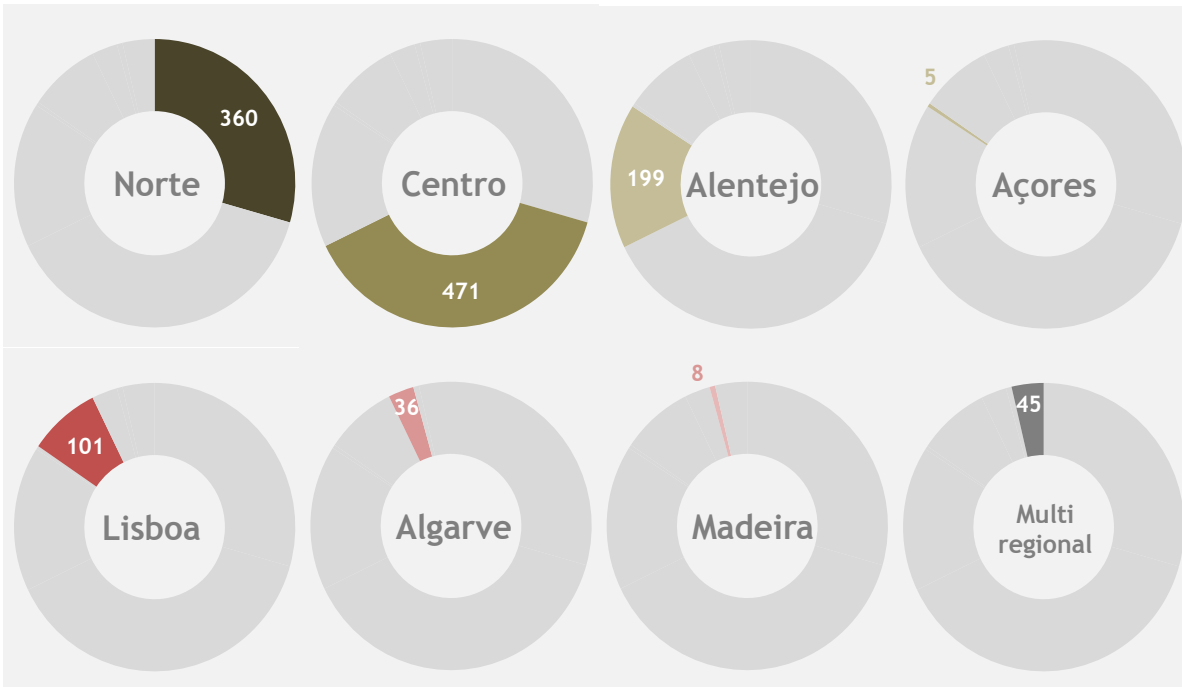

Financiamento por Região

Norte	1.554 M€
Centro	1.088 M€
Alentejo	1.023 M€
RA Açores	101 M€
Lisboa	374 M€
Algarve	127 M€
RA Madeira	233 M€
Multiregional	102 M€

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTES RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Atenuar a situação periférica do país por via da melhoria da conectividade internacional e Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o território nacional	
164 Km de novas estradas inseridas na rede transeuropeia de transportes	Eixo I, Eixo IV
48 Km de novas ferrovias inseridas na rede transeuropeia de transportes	Eixo I
386 Km de ferrovias modernizadas	Eixo I
12 Infraestruturas portuárias intervencionadas	Eixo I
Acréscimo de 1.400 mil toneladas/ano no tráfego de mercadorias via infraestruturas portuárias	Eixo I

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTES RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades com as respetivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos	
7 Km de novas linhas de transportes urbanos limpos	Eixo I (Metro do Porto)
12 Projetos de soluções inovadoras nas áreas da Mobilidade, Segurança e Governação Urbana	Eixo V

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTE RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o património natural	
6 Sítios contaminados recuperados	Eixo II- Passivos Ambientais
31 Áreas mineiras reabilitadas	Eixo II- Passivos Ambientais
15 Pedreiras abandonadas requalificadas	Eixo II- Passivos Ambientais
2 Lagoas que beneficiaram da correção de situações de eutrofização	Eixo III - RA Açores

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTES RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos	
341 Km de orla costeira onde as intervenções reduziram o risco associado à dinâmica costeira	Eixo II - Proteção Costeira
8 Km de linhas de água (ribeiras) intervencionadas para reduzir riscos de cheias e aluviões	Eixo IV - RA Madeira
139 Infraestruturas de proteção civil construídas ou requalificadas	Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
384 novos Veículos para operações de socorro e de proteção civil	Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTES RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e sustentabilidade	
526 Estações de Tratamento de Águas Residuais Construídas	Eixo II - Ciclo Urbano da Água
5.950 Km de redes de coletores de drenagem de águas residuais e 2.876 Km de rede de abastecimento de água construídas ou reabilitadas	Eixo II - Ciclo Urbano da Água
1.700 Mil habitantes servidos pelo reforço da capacidade de abastecimento de água	Eixo II - Ciclo Urbano da Água
4.354 Mil habitantes servidos pela melhoria dos sistemas de saneamento de águas residuais	Eixo II - Ciclo Urbano da Água
185 Km de Extensão da rede primária do EFMA construída	Eixo II - Alqueva
21 Mil ton./ano de resíduos separados na origem	Eixo II - Resíduos

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

E COM OS SEGUINTE RESULTADOS EM CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA DA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos	
114 Escolas intervencionadas no âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar	Eixo V - Escolas Ensino Secundário
141 Mil alunos beneficiados pelas intervenções em escolas com ensino secundário	Eixo V - Escolas Ensino Secundário
26 Infraestruturas universitárias e politécnicas construídas ou ampliadas	Eixo V - Equipamentos Estruturantes
7 Equipamentos culturais criados ou requalificados	Eixo V - Equipamentos Estruturantes
73 Equipamentos desportivos de base construídos ou requalificados	Eixo V - Equipamentos Desportivos
11 Centros de Alto Rendimento desportivo criados	Eixo V - Equipamentos Desportivos

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS...

... EM FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO JÁ EXECUTADO (ATÉ MARÇO 2015)

Fundo / Eixo Prioritário	Programado (milhões €)	Executado (milhões €)	Taxa de Execução	Por executar (milhões €)
Fundo de Coesão	3.060	2.533	83%	527
EP1 - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável	945	892	94%	53
EP2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos	1.775	1.390	78%	385
EP3 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores	105	79	76%	26
EP4 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira	235	172	73%	63
FEDER	1.283	1.140	89%	142
EP5 - Infra-estruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano	1.234	1.113	90%	121
EP6 - Assistência Técnica	49	27	56%	21
Programa Operacional Valorização do Território	4.343	3.674	85%	669



Mas o volume de fundos comunitários por executar é ainda muito elevado... e próximo de **840M€** quando considerados os montantes aprovados e a aprovar em *overbooking* (líquidos das perspetivas de quebras nos projetos em curso)

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE


OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FALTA FAZER...

... EM TERMOS DE EXECUÇÃO GLOBAL ATÉ 31 DEZ 2015

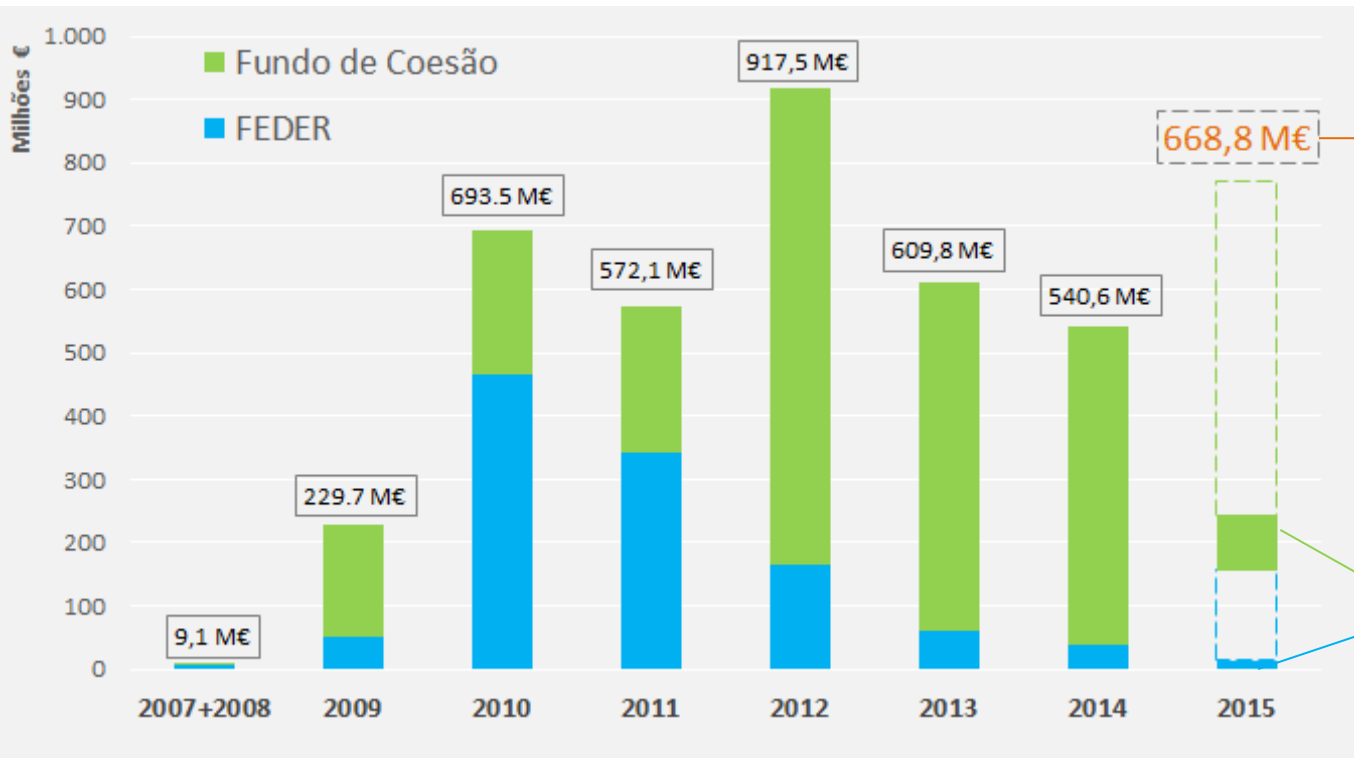

Valores por executar (entre abril e dezembro)

Valores já em executados em 2015 (entre janeiro e março)

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ACOMPANHAMENTO E AUDITORIAS

OBRIGAÇÕES APÓS RF

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FALTA FAZER...

... E EM TERMOS DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS,
INCLUINDO PROJETOS E APROVAÇÕES EM OVERBOOKING E PERSPETIVAS DE QUEBRAS

Fundo / Eixo Prioritário	Programado (milhões €)	Compromisso* (milhões €)	Executado (milhões €)	Por Realizar (milhões €)
Fundo de Coesão	3.060	3.211	2.533	677
EP1 - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável	945	1.015	892	124
EP2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos	1.775	1.893	1.390	503
EP3 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores	105	99	79	20
EP4 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira	235	203	172	31
FEDER	1.283	1.302	1.140	162
EP5 - Infra-estruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano	1.234	1.267	1.113	153
EP6 - Assistência Técnica	49	36	27	8
Programa Operacional Valorização do Território	4.343	4.513	3.674	839

Implica um esforço de execução mensal, até ao final de 2015, muito elevado (na ordem dos 90 M€/mês)!

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ACOMPANHAMENTO E AUDITORIAS

OBRIGAÇÕES APÓS RF

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO


* Compromisso incluindo overbooking, novas aprovações e expectativas de quebras de execução

POVT | PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FALTA FAZER...

... PARA ENCERRAR O POVT

Nº de projetos por intervalos de execução financeira

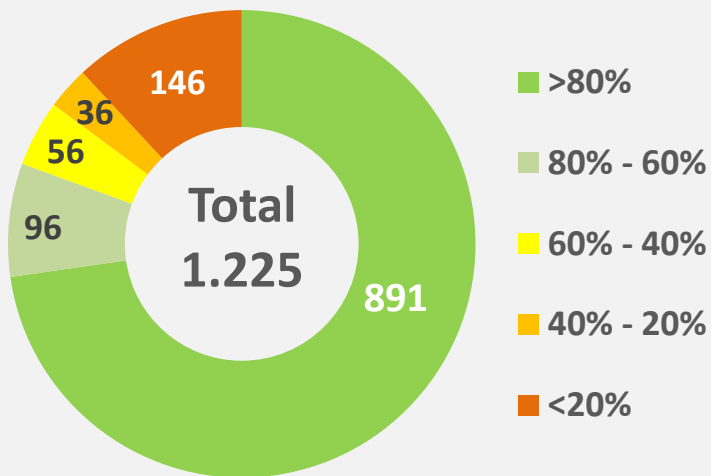

Apesar do elevado número de projetos cuja execução financeira está já acima de 80%, apenas foram apresentados à AG **611 Relatórios Finais**

É necessário **acelerar a apresentação de Relatórios Finais** e processo de encerramento formal dos projetos

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ACOMPANHAMENTO E AUDITORIAS

OBRIGAÇÕES APÓS RF

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

O QUE FALTA FAZER...

... CONTEXTO DO ENCERRAMENTO

Principais obrigações dos beneficiários a cumprir no encerramento dos projetos:

1. Elementos que devem acompanhar o Relatório Final;
2. Fecho das recomendações – ações acompanhamento e auditorias;
3. Obrigações em matéria de informação e publicidade;
4. Obrigações e procedimentos após aprovação do Relatório Final;
5. Calendário de encerramento.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

**O QUE
FALTA
FAZER...**

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES


INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENDÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CONTEXTO DE ENCERRAMENTO...



PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

RELATÓRIO FINAL...

... ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O RELATÓRIO FINAL:

- Conta final da(s) obra(s) relativa(s) à operação;
- Auto de receção provisória das empreitadas e dos equipamentos;
- Documentos que comprovem a operacionalização dos investimentos;
- Documentos que comprovem o cumprimento das obrigações ambientais que incidem sobre a operação, nomeadamente as que foram cumpridas ao longo do período de realização do investimento e no período de testes e ensaios;
- Documentos relativos ao licenciamento do investimento para exploração;

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

**ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL**

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

RELATÓRIO FINAL...

... ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O RELATÓRIO FINAL:

- Documentos de cálculo e de processamento das **Revisões de Preços**, com **índices definitivos**, independentemente de estar ou não prevista a sua elegibilidade no âmbito da operação;
- Nos casos em que o reforço das garantias é efetuado através de retenção depositada em conta bancária específica, disponibilizar os respetivos **extratos**. Saldos devem demonstrar que foi integralmente constituída a garantia e que se mantém com o montante previsto na legislação em vigor e no contrato para fazer face ao bom cumprimento de cada contrato;
- Nos casos em que tenham sido concedidos adiantamentos aos empreiteiros e fornecedores de equipamento, comprovar que tais **adiantamentos** se encontram totalmente **regularizados** através dos trabalhos realizados dentro do período de elegibilidade da operação;

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

RELATÓRIO FINAL...

... ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O RELATÓRIO FINAL:

- Montantes das **multas** aplicadas ao(s) empreiteiro(s) caso tal situação se tenha verificado;
- Comprovativo da execução dos **Planos de Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição** de cada uma das empreitadas;
- **Fotografias** e outros materiais de divulgação da operação que comprovem a adoção das medidas de **comunicação** do financiamento comunitário da operação, como sejam placas provisórias e definitivas, assim como fotografias, filmes ou outros materiais que comprovem a fase de realização, inauguração e o início da fase de exploração e de funcionamento dos investimentos cofinanciados no âmbito da operação;
- Todos os restantes elementos que se encontram previstos no **Manual de Procedimentos** do Beneficiário, no **Contrato** e na **Decisão de Financiamento**.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENDRÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

QUESTÕES DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Todas as recomendações decorrentes de **Auditorias** e/ou **Acompanhamentos**, bem como as consequências complementares destas, com exceção de processos judiciais em curso, têm de estar cumpridas **antes da aprovação do Relatório Final**.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

REVISÕES DE PREÇOS...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Nos contratos de empreitada e nos contratos que prevejam a realização de revisão de preços [art.380º do CCP], a não apresentação do apuramento e registo da revisão de preços, consubstancia-se num incumprimento legal
- Tendo em consideração o efeito de deflação de preços, que origina revisões de preços negativas, estas constituem despesas negativas que reduzem o montante elegível e que devem ser apresentadas em pedidos de pagamento, nos quais deverão ser integrados os documentos de cálculo e de processamento das revisões de preços [notas de crédito emitidas pelos empreiteiros ou notas de débito dos beneficiários]
- A não dedução das revisões de preços negativas é uma violação de uma disposição de direito comunitário, dado que consiste numa omissão de um agente económico que tem ou pode ter por efeito lesar o Orçamento Geral da União Europeia

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENDRÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

REFORÇO DE GARANTIA...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Nos casos em que o reforço das garantias é efetuado através de retenção depositada em conta bancária específica, deverão ser disponibilizados os respetivos extratos e os saldos devem ser consolidados e demonstrados, a fim de serem confirmados os saldos face à garantia da empreitada.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CONSERVAÇÃO DO IMOBILIÁRIO E INVENTÁRIO...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Comprometer-se a **manter** e **comprovar** a existência física e em boas condições de funcionamento e segurança dos bens e equipamentos adquiridos e das obras realizadas para a operação, bem como a manter o registo em inventário de todos os elementos do imobilizado, adquiridos para a mesma.

CONTAS DE OBRA ASSINADAS...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Apresentação das contas finais devidamente assinadas pelas partes

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

PUBLICITAÇÃO DO APOIO...

... FECHO DE RECOMENDAÇÕES – ALERTAS

- Proceder à publicitação dos apoios que lhe forem atribuídos, respeitando os termos dos artigos 8.º e 9.º do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro, e demais legislação comunitária e nacional aplicável, bem como as normas do POVT relativas à publicidade

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

Referência explícita ao apoio concedido

{ Obrigação das entidades beneficiárias (legislação comunitária e nacional)

Como?

Colocar em todos os suportes de divulgação e/ou publicidade:

1. Emblema da União Europeia e referência à mesma;
2. Referência ao Fundo em questão (FEDER ou Fundo de Coesão);
3. Logótipo do QREN;
4. Logótipo do POVT.

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

Exemplos:

1. Emblema da **União Europeia** e referência à mesma;



UNIÃO EUROPEIA

FUNDO DE COESÃO

2. Referência ao **Fundo** em questão (FEDER ou Fundo de Coesão);

“PROJETO COFINANCIADO PELO FUNDO DE COESÃO” ...

3. Logótipo do **QREN**;



QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL
PORTUGAL 2007-2013

4. Logótipo do **POVT**.



PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO
VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
2007-2013

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

Referência explícita ao apoio concedido

{ Obrigação das entidades beneficiárias (legislação comunitária e nacional)

Onde?

- * flyers, folhetos, brochuras e similares;
- * convites e programas,
- * website da entidade beneficiária,
- * publicidade em quaisquer meios de comunicação social,
- * cerimónias ou atos públicos que digam respeito à operação

[todos os tipos de materiais de divulgação]

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PLACA DEFINITIVA

Tem definidas dimensões mínimas?

{ Não.
Mas deve ser **visível** e de **dimensões importantes**, que permitam a visibilidade dos elementos gráficos

O que deve conter?

1. **Âmbito** do Projeto [Eixo e/ou Domínio onde se insere]
2. **Designação** do Projeto [Nome atribuído em sede de candidatura]
3. Indicação do **Fundo** [FEDER ou Fundo de Coesão, conforme projeto]
4. **Logotipos** POVT + QREN + UE [ocupar > 25% da superfície da placa]

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PLACA DEFINITIVA

Um exemplo:

Âmbito do Projeto

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

(nome atribuído em sede de candidatura)



Projeto co-financiado pela União Europeia



FEDER e/ou FUNDO DE COESÃO

Eixo II - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos / Ciclo Urbano da Água

Construção da Rede de Saneamento, Emissários e ETAR de Pelariga / Almagreira



LIGAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Projeto co-financiado pela União Europeia



FUNDO DE COESÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PLACA DEFINITIVA

Quando?

Até 6 meses após a conclusão da operação

Quem deve colocar?

Qualquer operação que satisfaça as condições:

- A participação pública total na operação excede **EUR 500 000**;
- A operação consiste na aquisição de um objeto físico ou no financiamento de trabalhos de infraestrutura ou construção.

E caso só satisfaça **uma** das condições?

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PLACA DEFINITIVA

Pode enviar-se para aprovação pelo POVT?

Sim.

Pelo email geral ou através do técnico que acompanha o projeto.

Quantas?

Depende do projeto e da sua tipologia.

No mínimo uma por projeto ou município.

Onde?

Em locais de maior visibilidade dentro do projeto.

Exemplo: Ciclo Urbano da Água > ETAR, ETA, ou EE...

E em que material?

Um material resistente e durável, devido ao carácter permanente que se pretende da placa.

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PLACA DEFINITIVA

Alguns exemplos:



PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

ETIQUETAS

Onde colocar?

Em todos os equipamentos ou outros materiais cofinanciados.

[Espaço poderá incluir o código de barras para efeitos de inventário dos equipamentos e/ou materiais]

O que deve conter?

1. Designação da Entidade Beneficiária
2. Designação do Projeto [Nome atribuído em sede de candidatura]
3. Indicação do Fundo [FEDER ou Fundo de Coesão, conforme projeto]
4. Logo POVT + QREN + UE



PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDRÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

OUTRAS OBRIGAÇÕES

{ Qualquer cerimónia ou ato público que diga respeito à operação, deve ser **comunicada** à Autoridade de Gestão, com a **antecedência mínima de um mês**.

[Inclui inaugurações.]

, devendo igualmente ser enviado **convite** à AG do POVT e à AD&C e, no caso dos Grandes Projetos, à Comissão Europeia.

{ **Press-release** [a anunciar as cerimónias] mencionando o cofinanciamento atribuído através do POVT, o Fundo Comunitário em aplicação e o montante atribuído.

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

OUTRAS OBRIGAÇÕES



Website.

Sempre que possível e justificável destacar operação cofinanciada no sítio da internet do beneficiário.

[Exemplo: **área informativa** com objetivos da intervenção, montantes, identificação do Fundo alocado, com a presença das três logomarcas obrigatórias. Utilizar fotografias e vídeos.]

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

**INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE**

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

INCUMPRIMENTO

O que acontece?

O incumprimento destas obrigações dará origem à suspensão de pagamentos ao beneficiário, até regularização da situação de incumprimento.

[Obrigações de informação e publicidade do financiamento comunitário constam no **contrato de financiamento** celebrado entre o beneficiário e a Autoridade de Gestão.]

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

NO PÓS-PROJETO

PROJETOS TRANSITADOS

[operações aprovadas que transitaram de Fundo/PO no âmbito da Reprogramação QREN 2011]

Suportes de comunicação e divulgação existentes [à data da transição]:

Não é exigida a alteração da menção ao Fundo/PO.

Suportes produzidos após a transição formal das operações:

Mencionar novo Fundo e Programa Operacional, bem como novo enquadramento (no caso do âmbito do Projeto na Placa Definitiva)

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENDRÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS...

... APÓS APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

A participação dos fundos para cada operação só fica definitivamente afeta a essa operação se, no prazo de **cinco anos** a contar da conclusão da operação, esta não sofrer qualquer alteração substancial que:

- Afete a sua **natureza** ou as suas **condições de execução** ou proporcione uma **vantagem indevida** a uma empresa ou um organismo público; e
- Resulte quer de uma **mudança** na natureza da propriedade de uma infraestrutura, quer da **cessação** de uma atividade produtiva.

Caso se verifique alguma alteração substancial, nos termos referido anteriormente, os montantes de financiamento comunitário atribuídos e pagos em relação à presente operação, terão que ser repostos pela entidade beneficiária ou entidade que a venha a substituir nas responsabilidades e atribuições relativas à mesma operação, de acordo com as normas fixadas nos artigos 98.º a 102.º do Regulamento comunitário n.º 1083/2006.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

O DOSSIER DA OPERAÇÃO...

... APÓS APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

- Organizado, de acordo com o preceituado no ponto **2.1** do capítulo 2 do **módulo C** do **Manual de Procedimentos do POVT**, seguindo o respetivo **anexo VIII**, modelo/índice de organização do *Dossier* de Operação.
- Tem de permitir **comprovação**, em sede de auditoria, da consistência da pista de auditoria e a existência de todos os suportes documentais e eletrónicos indispensáveis a uma “traçabilidade” **inequívoca** de todos os atos realizados no âmbito da operação.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

O DOSSIER DA OPERAÇÃO...

... APÓS APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

- A operação poderá, a qualquer momento após o seu encerramento, ser objeto de **auditoria**, por qualquer entidade habilitada para o efeito, pelo que a falta de elementos documentais poderá determinar a reposição de Fundos comunitários recebidos por essa entidade para a operação em causa.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CONSERVAÇÃO DO DOSSIER DA OPERAÇÃO...

... OBRIGAÇÕES – PERÍODO DE CONSERVAÇÃO

- Manter perante a Autoridade de Gestão do POVT e entidade que vir a ser responsável pelo seu encerramento, bem como perante a Autoridade de Certificação do FEDER e Fundo de Coesão (**AD&C**), um conjunto de obrigações a cumprir, por um período que vai até ao final de três anos após a aprovação pela Comissão Europeia do encerramento do POVT, [o que se admite que possa vir a ocorrer em 2022 ou 2023];
- Porém, este período poderá ser **prolongado**, em caso de ações judiciais ou na sequência de um pedido devidamente fundamentado da Comissão Europeia.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CONSERVAÇÃO DO DOSSIER DA OPERAÇÃO...

... OBRIGAÇÕES – PISTA DE AUDITORIA

- Durante este período mantem-se a obrigação de disponibilizar toda a documentação e registos relativos à operação, bem como o acesso às infraestruturas e equipamentos adquiridos com cofinanciamento comunitário no âmbito da operação para verificar da sua correta manutenção e utilização efetiva para os fins que presidiram à atribuição do cofinanciamento comunitário à operação, em auditorias que sejam determinadas pelas Autoridades Nacionais e Comunitárias.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CONSERVAÇÃO DO DOSSIER DA OPERAÇÃO...

... ALTERAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

- Face a eventuais alterações orgânicas que venham a verificar-se no mencionado período, as **obrigações do beneficiário** serão assumidas pela(s) entidade(s) para as quais tenham sido transferidas as competências e responsabilidades pela gestão das infraestruturas cofinanciadas, ou outras entidades designadas legalmente para a assunção de responsabilidades decorrentes do cofinanciamento comunitário à operação.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

AUDITORIAS PÓS-ENCERRAMENTO...

... CORREÇÕES FINANCEIRAS

Das ações de auditoria que sejam realizadas após o encerramento da operação, poderão resultar correções financeiras, por **irregularidades** detetadas, nomeadamente:

- por insuficiência de documentos e registos que comprovem a regularidade da execução da operação;
- por irregularidades na contratação pública e na realização física e financeira do projeto;
- apuramento de **receitas líquidas** do projeto que não foram identificadas no Estudo de Viabilidade Financeira (EVF) final da operação.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

AUDITORIAS PÓS-ENCERRAMENTO...

... CORREÇÕES FINANCEIRAS

Caso se apure, a qualquer tempo, que a operação gerou receitas líquidas não tidas em conta no EVF final da operação que deu origem ao montante do saldo final pago, mas que pudessem à data ter sido determinadas, o montante dessas receitas líquidas adicionais dará origem à **reposição do correspondente financiamento comunitário atribuído à operação.**

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

AUDITORIAS PÓS-ENCERRAMENTO...

... DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO

- A devolução de financiamento comunitário atribuído à presente operação, que venha a ser determinada pela deteção de despesas não elegíveis ou irregularidades detetadas no âmbito de auditorias específicas à operação e/ou ao POVT, com relevância na presente operação, é de inteira **responsabilidade** da entidade beneficiária, ainda que essas despesas tenham sido consideradas elegíveis e validadas pela Autoridade de Gestão do POVT.

PONTO DE
SITUAÇÃO

O QUE
FIZEMOS ...

O QUE
FALTA
FAZER...

ORIENTAÇÕES
PARA O
ENCERRAMENTO

ELEMENTOS
RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E
RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE


OBRIGAÇÕES
APÓS RF

CALENÁRIO
ENCERRAMENTO

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO...

... ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

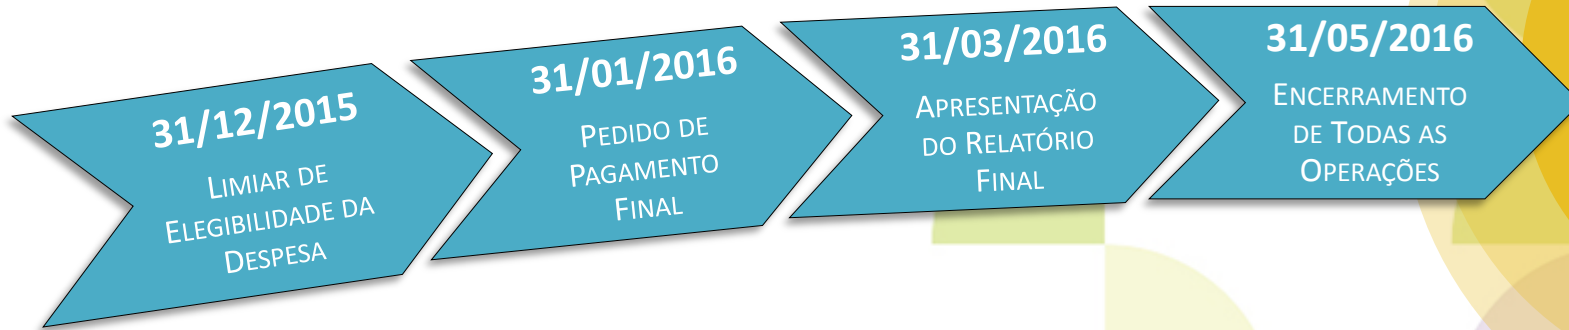

PONTO DE SITUAÇÃO

O QUE FIZEMOS ...

O QUE FALTA FAZER...

ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO

ELEMENTOS RELATÓRIO FINAL

ALERTAS E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

OBRIGAÇÕES APÓS RF

CALENDÁRIO ENCERRAMENTO

MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO

HELENA PINHEIRO DE AZEVEDO,

GESTORA DO PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO



VALORIZAR O TERRITÓRIO SETE ANOS DE POVT

